Ο.Α.Κ. Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΜΑΡΙΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Α/Α	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	ΑΡΧΗ	ΤΕΛΟΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1.	**ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**			1 μέρα
2.	**ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ**			6 μήνες
2.1	*Τοπογραφικές εργασίες - αποτυπώσεις*			1 μήνας
2.2	*Εγκατάσταση εργοταξίου - εισκόμιση εξοπλισμού - προσβάσεις*			2 μήνες
	Ολοκλήρωση μελετών, Απαιτούμενες αδειοδοτήσεις,			6 μήνες
3.	**ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**			1 μέρα
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ			21 μήνες
3.1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			5 μήνες
3.2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Μ. - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ			16 μήνες
3.3	ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η-Μ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ			16 μήνες
14.	**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ**			2 μήνες
15	**ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**			6 μήνες
16	**ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**			12 μήνες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

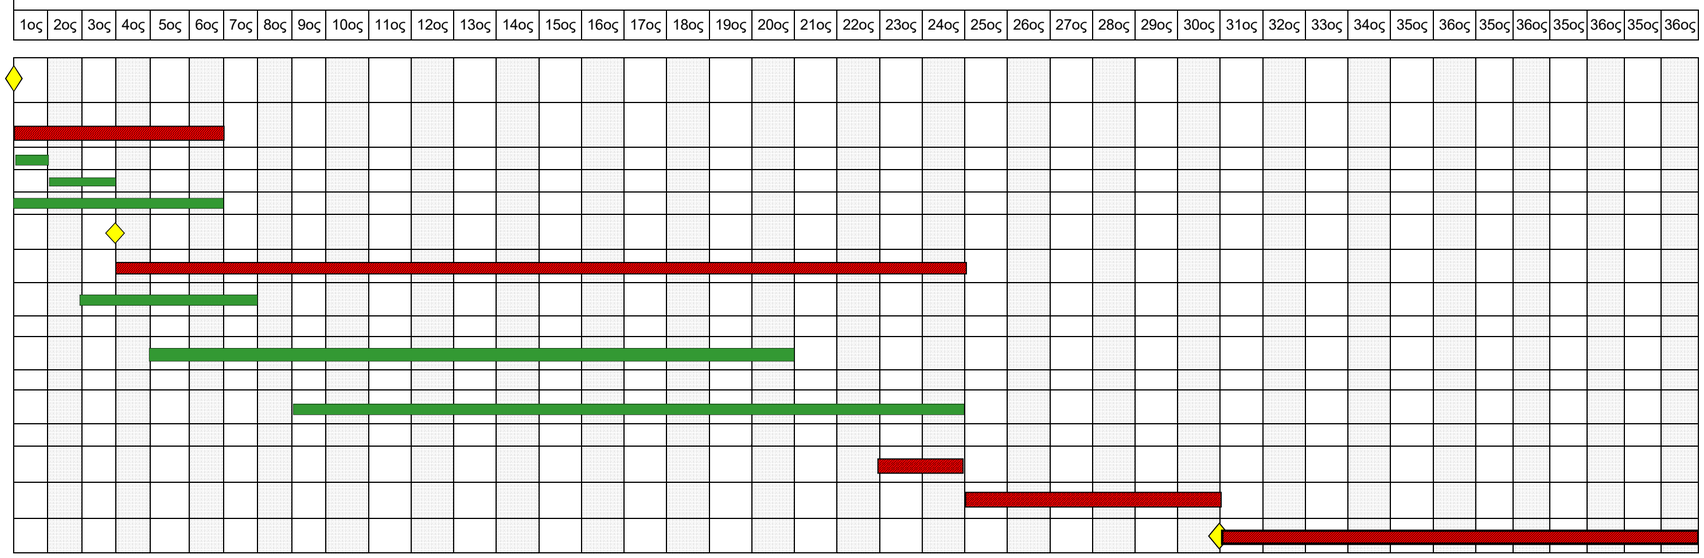

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΝΤΗΣ ΤΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΑΕ

ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
